

文件代碼	版本	制定單位	生效日期
—	Version 1	IT 小隊	2026-06-01

0.1 版本歷程

版次	日期	修訂摘要
Version 1	2026-06-01	初版,試行至 2026-07-01(財務部門限定)

1. 目的

規範資訊需求之提出格式 + IT 反饋規範,確保雙邊認知對齊。

2. 適用範圍

財務部門同仁向 IT 小隊提出之資訊需求(試行階段,僅限財務部門;指需要 IT 動手做的事:新建工具、串接系統、客製化等;不含硬體報修、帳號申請、軟體採購等例行庶務)。

3. 試行期與背景

自 2026-06-01 起,WitsPer 財務部門向 IT 小隊提出資訊需求,採用本指引規範之 Email 形式。試行期 1 個月(至 2026-07-01)。

過去資訊需求的提出方式分散在 Slack、口頭、Email、面談多個管道;IT 收到時常缺少關鍵資訊,後續來回追問、認知落差、重工。本指引把「一份需求該長什麼樣」「IT 該如何反饋」雙邊都寫清楚,讓需求進到 IT 時資訊充足、雙方對齊有節奏。

試行期滿後,依運作結果決定:


- 順暢 → 擴大適用至全公司(階段 2)
- 仍有摩擦 → 修訂本指引、延長試行
- 全公司試行穩定後 → 升級為線上表單(階段 3)
- 線上表單穩定後 → 轉為正式 SOP(階段 4)

4. 一個資訊需求從提出到上線會走 8 個階段

本指引規範前 2 個階段(同仁參與)與 IT 收件後的反饋(\$5),後續 6 個階段由 IT 小隊內部跑:

階段	內容	同仁角色
1	需求提出	同仁起草、主管寄出(\$3)
2	需求確認	同仁配合對齊細節(\$4)
3	SA / SD(系統分析與設計)	等通知
4	風險評估 / 工時評估	收到評估結果
5	排程	收到排程通知
6	開發	等通知
7	測試	等通知
8	上線 / 驗收	同仁驗收

4.1 圖示流程

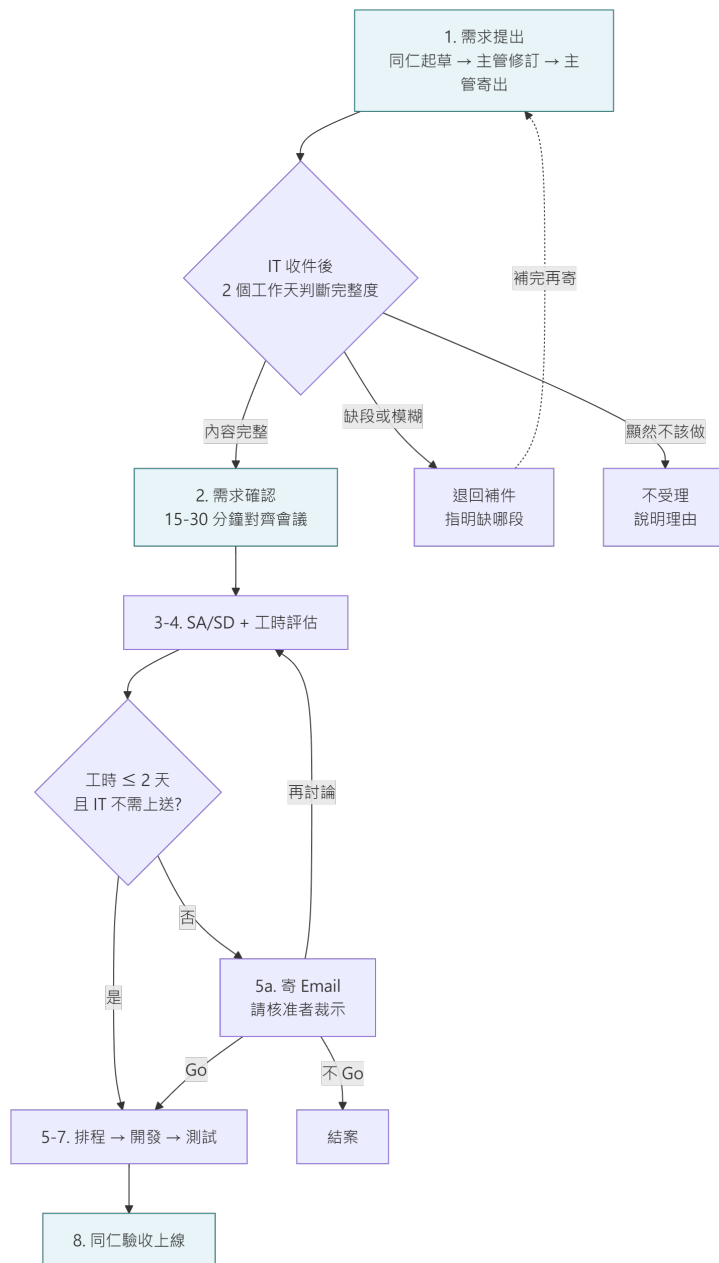

藍框為同仁實際參與的環節(階段 1、2、8)。工時 ≤ 2 個工作天且 IT 不上送時,跳過核准直接進排程。

5. 第 1 階段:需求 Email 怎麼寫

5.1 流程:同仁起草、主管寄出

同仁先寫好需求 Email 初稿 → 寄給直屬主管 → 主管修訂 → 主管寄出。

由主管寄出,自帶「主管已同意此需求」的意義;不另設批准簽核。

5.2 收件人 / CC 規則

- 收件人:IT@witsper.com
- CC:提出需求的同仁本人
- 主旨格式:[資訊需求] 一句話描述要解的問題
 - 範例:[資訊需求] 每週 104 履歷整理花太久

5.3 Email 內容:六個必要段落

即使附件規格再完整,六段仍要寫。附件是補充材料,不是替代品——只丟附件 + 一句「請評估並新增」,IT 無法判斷可行性,只會退回。

一封好的需求 Email,IT 看完應該能回答:這個需求是什麼、目前怎麼做、痛在哪、希望變成什麼樣、誰會用、什麼時候要。具體寫六段:

5.3.1 (1) 一句話描述要解的問題

描述「問題」,不寫「解決方案」。

好	不好
每週整理 104 履歷要花 2 小時,常常複製錯	想做一個自動抓履歷的工具

理由:如果第一句寫成解決方案,後面的描述會跟著用「解決方案」的思路,IT 看不到真正的問題,可能漏掉更簡單的解法。

5.3.2 (2) 現在實際上怎麼做這件事

條列真實的操作步驟。1, 2, 3, 4..... 越具體越好。再附上每次花多久、多常做。

好	不好
1. 打開 104 後台 2. 一份一份點開履歷 3. 複製姓名、學歷、經歷貼到 Notion 4. 手動加標籤 5. 寄信通知用人主管 每次約 2 小時,每週一次	就是把履歷整理進系統,每週都要做

5.3.3 (3) 現在的流程裡最痛苦的點

條列真實痛點。寫「現在哪裡卡住、出錯、浪費時間」,不寫「我想要什麼功能」。

好	不好
1. 複製貼上容易漏字或貼錯欄位 2. 同一份履歷有時收到三次,要手動去重 3. 用人主管收到通知常常忘記回覆,要追	沒有自動化

5.3.4 (4) 解決後希望的狀態

用這個句型:「當 ___ 時,我希望能 ,這樣我就能 。」

範例:當 104 有新履歷進來時,我希望系統能自動整理進 Notion 並通知用人主管,這樣我就能把每週省下的 2 小時花在面試上。

5.3.5 (5) 使用者與規模

列出會用這套東西的角色、部門、人數。預估每次能節省多少時間。

範例:HR 大隊 3 人 + 用人主管 5 人。預估每週省 2 小時。

5.3.6 (6) 期望完成時間

選項	補充說明
一週內	在 Email 中說明原因(例:客戶活動已定 X 月 X 日)
兩週內	不需補充
一個月內	不需補充
不急,IT 排程	不需補充

5.4 附件(選填)

附上目前流程的截圖、想參考的工具範例、相關文件、規格清單。一張好截圖勝過 500 字描述。

再次提醒:有附件不代表正文可以省略。附件是補充,六段仍要寫。

6. 第 2 階段:IT 發起需求確認後,同仁配合什麼

主管寄出 Email 後,IT 小隊在 2 個工作天內回覆。Email 內容完整則排定需求確認(15-30 分鐘的對齊會議,視訊或面談);不完整則先退回補件(IT 端規範詳 §5)。

需求確認是制度上的必經之路,不是 IT 對個別需求有疑慮。Email 把需求描述到約 70%,剩下 30% 靠對齊把細節釐清——可行性、技術約束、優先順序、驗收標準。

6.1 同仁在需求確認時要做的事

- 提需求的同仁出席(主管視情況到)
- 帶上原始 Email 與相關附件
- 對 IT 的提問如實回答;現場答不出來的,會後補上

6.2 需求確認後 IT 的回覆

IT 用 Email 回覆結論,三種可能:

結論	同仁要做的事
進入第 3 階段(SA/SD)	等通知,IT 會給工時評估
需求調整後再評估	依 IT 建議調整,進新一輪確認
不受理	IT 回覆中說明理由(例:有現成工具、成本不對等)

7. IT 端反饋規範

本節給 IT 小隊同仁:收到資訊需求 Email 後,如何在 2 個工作天內回覆。

7.1 收件後的第一個動作:判斷完整度

IT 收到 Email 後,先檢查:

- 六段是否齊全

- 描述是否能讓 IT 在不問問題的情況下判斷可行性與工時

依結果走三條路:

完整度	動作	詳見
六段齊全且能評估	排定需求確認會議	\$5.3
缺段或描述模糊	退回補件	\$5.2
顯然不該由 IT 做	不受理	\$5.4

7.2 退回補件的回覆內容

退回補件信明確指出三件事:

1. **缺哪段**:具體點出六段中哪幾段沒寫(或寫得不完整)
2. **為什麼缺這段會擋住評估**:讓需求方理解不是刁難
3. **補完哪些可再送**:給出明確的下一步

範例:

你好,

收到資訊需求,但無法直接進入評估,需要補充以下:

1. **現在實際怎麼做**:目前只寫「對齊 BI 與帳務差異」,沒有實際對帳的步驟。缺這段我無法判斷是流程問題、資料問題、還是邏輯問題。
2. **期望完成時間**:沒有寫,影響排程判斷。

補完這兩點再寄一次即可。

— IT 小隊

7.3 受理(排定需求確認)的回覆內容

受理信包含:

- **確認會議時間**:具體日期與時段(2-3 個選項供需求方挑)
- **誰要到**:預設提需求的同仁出席;主管視情況
- **請帶什麼**:原始 Email、附件、相關截圖
- **預估會議長度**:15-30 分鐘

7.4 不受理的回覆內容

不受理信包含:

- **理由:**寫清楚。例:「現有的 X 工具能解,不需要 IT 開發」、「成本不對等,評估非優先」、「需求屬於 Y 部門權責範圍」
- **替代方案:**如果有,盡量提

7.5 工時評估完成後:IT 自決門檻

IT 完成工時評估後,依工時決定下一步:

- **工時 ≤ 2 個工作天** → IT 自行決定開工
- **工時 > 2 個工作天** → 寄 Email 給核准者(試行階段 = COO)請核准者回覆 Go / 不 Go

WitsPer 尊重 IT 專業判斷。即便工時 ≤ 2 天,若 IT 自行認為有寄信請示之必要(例:資源排擠、優先順序衝突、影響需高層裁示),仍可主動寄——這是 IT 的判斷權,非例外條款。

7.6 給核准者的 Email 該寫什麼

工時 > 2 個工作天或 IT 主動上送時,寄一封 Email 給核准者,內文包含:

- 需求摘要(1 句話)
- 預估工時(人天)
- 預計開工日 + 預計完成日
- 影響範圍 / 預期效益(誰會用、能省什麼)
- 是否排擠現有 IT 工作(是 → 列出排擠項)
- IT 建議:Go / Hold / 不建議(附簡短理由)

核准者 reply 回覆:Go / 不 Go / 再討論。預期回覆時間 2-3 個工作天內。

8. 第 3-8 階段:同仁會看到什麼

第 3-8 階段(SA/SD、風險評估、排程、開發、測試、上線驗收)由 IT 小隊內部跑。同仁在以下時點收到 IT 的通知:

- **工時評估完成**
 - 工時 ≤ 2 天 → IT 直接告知預計交付時間
 - 工時 > 2 天(或 IT 主動上送) → IT 告知「已寄信給核准者請示」

- 核准結果(僅需上送的需求)
 - Go → IT 告知預計開工日
 - 不 Go → IT 告知理由;同仁可依理由調整後重提
 - 再討論 → IT 約再評估,同仁配合
- 排程確認 → IT 通知預計開工日
- 開發完成 → IT 邀請驗收
- 驗收通過 → 正式上線

需求變更、優先順序變動,直接 reply 原始 Email 串告訴 IT。

9. 試行期反饋管道

試行期間,以下情況請告知 COO 特助:

- 某個段落不知道怎麼填
- IT 來回追問同樣的問題很多次
- 某個流程環節卡住超過 3 個工作天
- 對本指引有任何改進想法

試行期滿(2026-07-01),IT 小隊整理反饋並決定下一階段。

10. 相關文件

- 《文件寫作手冊》

11. 使用表單

N/A
